

南予地域柑橘農業復興対策チーム

第14回会議 資料

1	復旧状況について	1
	(1) 施設面の復旧状況	2
	(2) 生産面の復旧状況	5
2	中・長期的対策について	7
	(1) 園地復旧について	7
	①原形、改良復旧の取組状況	8
	②再編復旧の推進について	12
	(2) 営農支援策について	15
3	その他	20

1 復旧状況について

(1) 施設面の復旧状況

平成30年7月豪雨災害におけるかんきつ被害・復旧状況【宇和島市】

R3.5.31

項目 地区	年月日	農道損壊・復旧状況 ※1			自動化スプリンクラー損壊・復旧状況				モノレール損壊					
		損壊 本数 (本)	未復旧 (本)	復旧中 (本)	復旧済 (本)	計 (block)	未稼働 (block)	稼働 (block)	復旧率 (%)	損壊 箇所 (箇所)	未修復 (箇所)	修復済 (箇所)	修復済 (%)	
立間	H30.8.30	10		5	5	3	1	2	38	160	155	5	3	
	10.17				10		1	2	40		145	15	9	
	H31.3.31								3		95	27	133	83
	R1.6.30								3		95	22	138	86
	9.30								3		95	17	143	89
	R2.5.23								3		95	16	144	90
	R2.10.31								3		95	16	144	90
R3.5.31						3	95	10	150	94				
吉田	H30.8.30	2	1		1	9	1	8	68	48	43	5	10	
	10.17				2		1	8	75		35	13	27	
	H31.3.31								9		87	14	34	71
	R1.6.30								9		94	10	38	79
	9.30								9		94	4	44	92
	R2.5.23								9		94	3	45	94
	R2.10.31								9		94	3	45	94
R3.5.31						9	96	2	46	96				
奥南	H30.8.30	3			3	11		11	71	71	64	7	10	
	10.17				3			11	71		34	37	52	
	H31.3.31								11		93	13	58	82
	R1.6.30								11		93	11	60	85
	9.30								11		93	8	63	89
	R2.5.23								11		93	6	65	92
	R2.10.31								11		93	6	65	92
R3.5.31						11	92	5	66	93				
喜佐方	H30.8.30	15	1	7	7	5	2	3	48	77	64	13	17	
	10.17				15		2	3	48		55	22	29	
	H31.3.31								5		65	15	62	81
	R1.6.30								5		76	12	65	84
	9.30								5		76	10	67	87
	R2.5.23								5		76	9	68	88
	R2.10.31								5		76	9	68	88
R3.5.31						5	88	9	68	88				
玉津	H30.8.30	15	3	4	8	11	5	6	29	(239) 277	(224)	(15)	6	
	10.17				15		4	7	35		(206)	(33)	14	
	H31.3.31						1	10	68		91	186	67	
	R1.6.30						1	10	78		76	201	73	
	9.30							11	84		39	238	86	
	R2.5.23							11	84		35	242	87	
	R2.10.31							11	84		35	242	87	
R3.5.31					11	84	21	256	92					
高光 宇和島	H30.8.30	32			32	15		15	89	(26) 34	(21)	(5)	19	
	10.17				32			15	95		(12)	(14)	54	
	H31.3.31							15	95		6	28	82	
	R1.6.30							15	95		5	29	85	
	9.30							15	95		1	33	97	
	R2.5.23							15	95			34	100	
	R2.10.31							15	95			34	100	
R3.5.31					15	99		34	100					
計(a)	H30.8.30	77	5	16	56	54	9	45	62	(621) 667	(571)	(50)	8	
	10.17				77		8	46	66		(487)	(134)	22	
	H31.3.31						1	53	85		141	526	79	
	R1.6.30						1	53	89		136	531	80	
	9.30							54	90		79	588	88	
	R2.5.23							54	90		69	598	90	
	R2.10.31							54	90		69	598	90	
R3.5.31					54	92	47	620	93					

※1 「農道損壊・復旧状況」欄の「復旧済本数」は、仮復旧済みの農道を含む。

平成30年7月豪雨災害におけるかんきつ被害・復旧状況【東宇和】

R3.5.31

項目 地区	年月日	農道損壊・復旧状況 ※1			自動化スプリンクラー損壊・復旧状況				モノレール損壊				
		損壊 本数 (本)	未復旧 (本)	復旧中 (本)	復旧済 (本)	計 (block)	未稼働 (block)	稼働 (block)	復旧率 (%)	損壊 箇所 (箇所)	未修復 (箇所)	修復済 (箇所)	修復済 (%)
明浜	H30.8.30	180	10	60	110	15	2	13	87	264	264		0
	10.17		2	58	120			15	94		239	25	9
	H31.3.31			19	161			15	94		27	237	90
	R1.6.30			12	168			15	94		10	254	96
	9.30			12	168			15	94		6	258	98
	R2.5.23			10	170			15	96		4	260	98
	R2.10.31			6	174			15	97		2	262	99
R3.5.31		2	178		15	100		264	100				
三瓶	H30.8.30	55	5	40	10	9		9	100	3	3		0
	10.17		1	9	45			9	100		2	1	33
	H31.3.31			2	53			9	100			3	100
	R1.6.30			2	53			9	100			3	100
	9.30			2	53			9	100			3	100
	R2.5.23			2	53			9	100			3	100
	R2.10.31			2	53			9	100			3	100
R3.5.31		2	53		9	100		3	100				
計(a)	H30.8.30	235	15	100	120	24	2	22	92	267	267	0	0
	10.17		3	67	165			24	95		241	26	10
	H31.3.31		0	21	214			24	95		27	240	90
	R1.6.30		0	14	221			24	95		10	257	96
	9.30		0	14	221			24	95		6	261	98
	R2.5.23		0	12	223			24	97		4	263	99
	R2.10.31			8	227			24	97		2	265	99
R3.5.31		4	231		24	100		267	100				

※1 「農道損壊・復旧状況」欄の「復旧済本数」は、仮復旧済みの農道を含む。

平成30年7月豪雨災害におけるかんきつ被害・復旧状況【八西地区】

R3.5.31

項目 地区	年月日	農道損壊・復旧状況 ※1			自動化スプリンクラー・損壊・復旧状況				モノレール損壊				
		損壊 本数 (本)	未復旧 (本)	復旧中 (本)	復旧済 (本)	計 (block)	未稼働 (block)	稼働 (block)	復旧率 (%)	損壊 箇所 (箇所)	未修復 (箇所)	修復済 (箇所)	修復済 (%)
真穴	H30.8.30	1	1			12		12	100	1	1		
	10.17		1				12	100	1				
	H31.3.31		1				12	100			1	100	
	R1.6.30		1				12	100			1	100	
	9.30		1				12	100			1	100	
	R2.5.23						1	100			1	100	
	R2.10.31						1	100			1	100	
R3.5.31				1	100		1	100					
川上	H30.8.30	4	1		3	11		11	100	6	6		
	10.17		1		3		11	100	6				
	H31.3.31		1		3		11	100	1		5	83	
	R1.6.30		1		3		11	100			6	100	
	9.30		1		3		11	100			6	100	
	R2.5.23						4	100			6	100	
	R2.10.31						4	100			6	100	
R3.5.31				4	100		6	100					
八幡浜	H30.8.30	6	1	1	4	9		9	99	6	6		
	10.17		1		5		9	99	5		1	17	
	H31.3.31		1		5		9	99	4		2	33	
	R1.6.30		1		5		9	99	3		3	50	
	9.30		1		5		9	99	2		4	67	
	R2.5.23						6	99	2		4	67	
	R2.10.31						6	99	2		4	67	
R3.5.31				6	100		6	100					
日の丸	H30.8.30	8				8		8	91	2	2		
	10.17						8	91	2				
	H31.3.31						8	91			2	100	
	R1.6.30						8	91			2	100	
	9.30						8	100			2	100	
	R2.5.23						8	100			2	100	
	R2.10.31						8	100			2	100	
R3.5.31				8	100		2	100					
八協	H30.8.30	1	1		1	11				11	11		
	10.17								10		1	9	
	H31.3.31						1		4		7	64	
	R1.6.30						1		4		7	64	
	9.30						1		1		10	91	
	R2.5.23						1		1		10	91	
	R2.10.31						1				11	100	
R3.5.31				1			11	100					
みつる	H30.8.30	10	3		7	39	1	38	92	53	52	1	2
	10.17		3		7		1	38	92		41	12	23
	H31.3.31		3		7		1	38	92		19	34	64
	R1.6.30		3		7		1	38	92		8	45	85
	9.30		3		7		1	38	92		7	46	87
	R2.5.23		1		9			39	97		7	46	87
	R2.10.31		1		9			39	97		2	51	96
R3.5.31	1		9		39	99		53	100				
計(a) ※2	H30.8.30	22	6	2	14	79	1	78	95	79	78	1	1
	10.17		6	2	14		1	78	95		65	14	18
	H31.3.31		6		16		1	78	95		28	51	65
	R1.6.30		6		16		1	78	95		15	64	81
	9.30		6		16		1	78	95		10	69	87
	R2.5.23		1		21			79	99		10	69	87
	R2.10.31		1		21			79	99		4	75	95
R3.5.31	1		21		79	99		79	100				
伊方	H30.8.30	4	3		1	34		34	99	5	5		
	10.17		3		1		34	99	5				
	H31.3.31		3		1		34	99	3		2	40	
	R1.6.30		3		1		34	99			5	100	
	9.30		3		1		34	99			5	100	
	R2.5.23						4	99			5	100	
	R2.10.31						4	99			5	100	
R3.5.31				4	100		5	100					
三崎	H30.8.30	7				7		7	100	2	2		
	10.17						7	100	2				
	H31.3.31						7	100	1		1	50	
	R1.6.30						7	100			2	100	
	9.30						7	100			2	100	
	R2.5.23						7	100			2	100	
	R2.10.31						7	100			2	100	
R3.5.31				7	100		2	100					
計	H30.8.30	4	3		1	41		41	99	7	7		
	10.17		3		1		41	99	7				
	H31.3.31		3		1		41	99	4		3	43	
	R1.6.30		3		1		41	99			7	100	
	9.30		3		1		41	99			7	100	
	R2.5.23						4	99			7	100	
	R2.10.31						4	99			7	100	
R3.5.31				4	100		7	100					
合計	H30.8.30	26	9	2	15	120	1	119	96	86	85	1	1
	10.17		9	2	15		1	119	96		72	14	16
	H31.3.31		9		17		1	119	96		32	54	63
	R1.6.30		9		17		1	119	96		15	71	83
	9.30		9		17		1	119	96		10	76	88
	R2.5.23		1		25			120	99		10	76	88
	R2.10.31		1		25			120	99		4	82	95
R3.5.31	1		25		120	99		86	100				

※1 「農道損壊・復旧状況」欄の「復旧済本数」は、仮復旧済みの農道を含む。
 ※2 磯津地区は3項目について被害がなかったため省略

(2) 生産面の復旧状況

温州みかんの販売状況 (JA:市場出荷のみ)

【えひめ南農業協同組合】

	出荷量			販売金額			kg単価			
	R2	R元	H30	H29	H30	H29	R2	R元	H30	H29
極 早 生	72%	92%	84%	100%	87%	95%	120%	103%	111%	100%
早 生	117%	125%	113%	100%	120%	114%	103%	91%	100%	100%
中生(普通含む)	127%	121%	129%	100%	96%	88%	75%	73%	83%	100%
計	108%	114%	110%	100%	102%	98%	94%	86%	96%	100%

【東宇和農業協同組合】

	出荷量			販売金額			kg単価					
	R2	R元	H30	H29	R2	R元	H30	H29	R2	R元	H30	H29
極 早 生	85%	89%	93%	100%	84%	100%	103%	100%	96%	110%	110%	100%
早 生	92%	101%	100%	100%	90%	104%	101%	100%	97%	104%	102%	100%
中生(普通含む)	147%	122%	137%	100%	104%	91%	127%	100%	71%	75%	93%	100%
計	108%	105%	110%	100%	94%	99%	111%	100%	87%	94%	101%	100%

【西宇和農業協同組合】

	出荷量			販売金額			kg単価					
	R2	R元	H30	H29	R2	R元	H30	H29	R2	R元	H30	H29
極 早 生	78%	111%	101%	100%	89%	113%	109%	100%	114%	102%	108%	100%
早 生	122%	131%	117%	100%	126%	129%	115%	100%	103%	98%	98%	100%
中生(普通含む)	131%	130%	122%	100%	120%	114%	113%	100%	91%	88%	94%	100%
計	120%	129%	117%	100%	122%	123%	114%	100%	101%	95%	97%	100%

2 中・長期的対策について

(1) 園地復旧について

- ①原形、改良復旧の取組状況
(農地・農業用施設災害復旧事業)

○ 宇和島市吉田町の災害復旧工程について(原形復旧、改良復旧)

1. 宇和島市執行分

R3.5.31現在

区分	事業名	工法	区分	全体 件数	令和2年度まで		令和3年度				備考
					執行済	率	(R3.5.31現在)		残		
							執行済 (累計)	率 (累計)	執行予定 (累計)	率 (累計)	
農地 (樹園地)	市単独事業	土砂撤去 原形復旧	本復旧工事	550件	530件	96%	0件 (530件)	0% (96%)	20件 (550件)	4% (100%)	
	国庫補助事業 (災害復旧事業)	原形復旧 (10ha)	本復旧工事	144件	114件	79%	9件 (123件)	6% (85%)	21件 (144件)	15% (100%)	
		改良復旧 (2ha)	本復旧工事	2件	2件	100%			(0件)	(100%)	

- 【課題】
- ・工事の入札不調対策 ⇒ 県・市発注機関と優先順位の設定などの調整を図るとともに、関係団体との意見交換を密に行うなど、受注しやすい環境づくりを図る。
 - ・復旧工事の進捗 ⇒ 市道・河川の災害復旧工事等の隣接工事と工程調整を進めるとともに、営農に支障がない程度に農家の協力を依頼し進捗を図る。

2. 県受託執行分

R3.5.31現在

区分	事業名	施設名	区分	全体 件数	令和2年度まで		令和3年度				備考
					執行済	率	(R3.5.31現在)		残		
							執行済 (累計)	率 (累計)	執行予定 (累計)	率 (累計)	
県営造成 畑地かんがい 施設	県受託工事 (国庫補助事業 (災害復旧事業))	県営幹線 水路	本復旧工事	3件	3件	100%			(0件)	(100%)	完了
		県営幹線 ポンプ	本復旧工事	2件	2件	100%			(0件)	(100%)	
		自動化施設 (園内幹・支線 スプリンクラー)	本復旧工事	34件	34件	100%			(0件)	(100%)	

- 【課題】
- ・県営幹線及び園内幹・支線復旧 ⇒ 市道や河川などの災害復旧工事等との工程調整を図るとともに、地域外からの作業員確保対策を支援する。
 - ・スプリンクラー復旧 ⇒ 農地復旧工事等との工程調整や優先順位の調整を図るとともに、営農に支障がない程度に農家の協力を依頼し進捗を図る。

○ 西予市明浜町の災害復旧工程について(原形復旧)

1. 西予市執行分

R3.5.31現在

区分	事業名	工法	区分	全体 件数	令和2年度まで		令和3年度				備考
					執行済	率	(R3.5.31現在)		残		
							執行済 (累計)	率 (累計)	執行予定 (累計)	率 (累計)	
農地 (樹園地)	市単独事業	土砂撤去 原形復旧	本復旧工事	8件	7件	88%	0件 (7件)	0% (88%)	1件 (8件)	12% (100%)	
	国庫補助事業 (災害復旧事業)	原形復旧 (2ha)	本復旧工事	10件	8件	80%	2件 (10件)	20% (100%)	(10件)	(100%)	

2. 県受託執行分

R3.5.31現在

区分	事業名	施設名	区分	全体 件数	令和2年度まで		令和3年度				備考
					執行済	率	(R3.5.31現在)		残		
							執行済 (累計)	率 (累計)	執行予定 (累計)	率 (累計)	
県営造成 畑地かんがい 施設	県受託工事 (国庫補助事業 (災害復旧事業))	自動化施設 (園内幹・支線 スプリンクラー)	本復旧工事	8件	8件	100%	(8件)	(100%)	(8件)	(100%)	完了

○ 復旧状況写真

1. 原形復旧



(立間)



(白浦)



(法花津)R3. 3月植栽完了



(知永)

2. 県営造成畑地かんがい施設(県受託工事)
宇和島市吉田町



(法花津)



(R3. 3. 16 知永散水状況)

西予市明浜町




(法花津)



(R3. 4. 15大浦散水状況)

畑地かんがい施設災害復旧工事 位置図


宇和島市吉田町

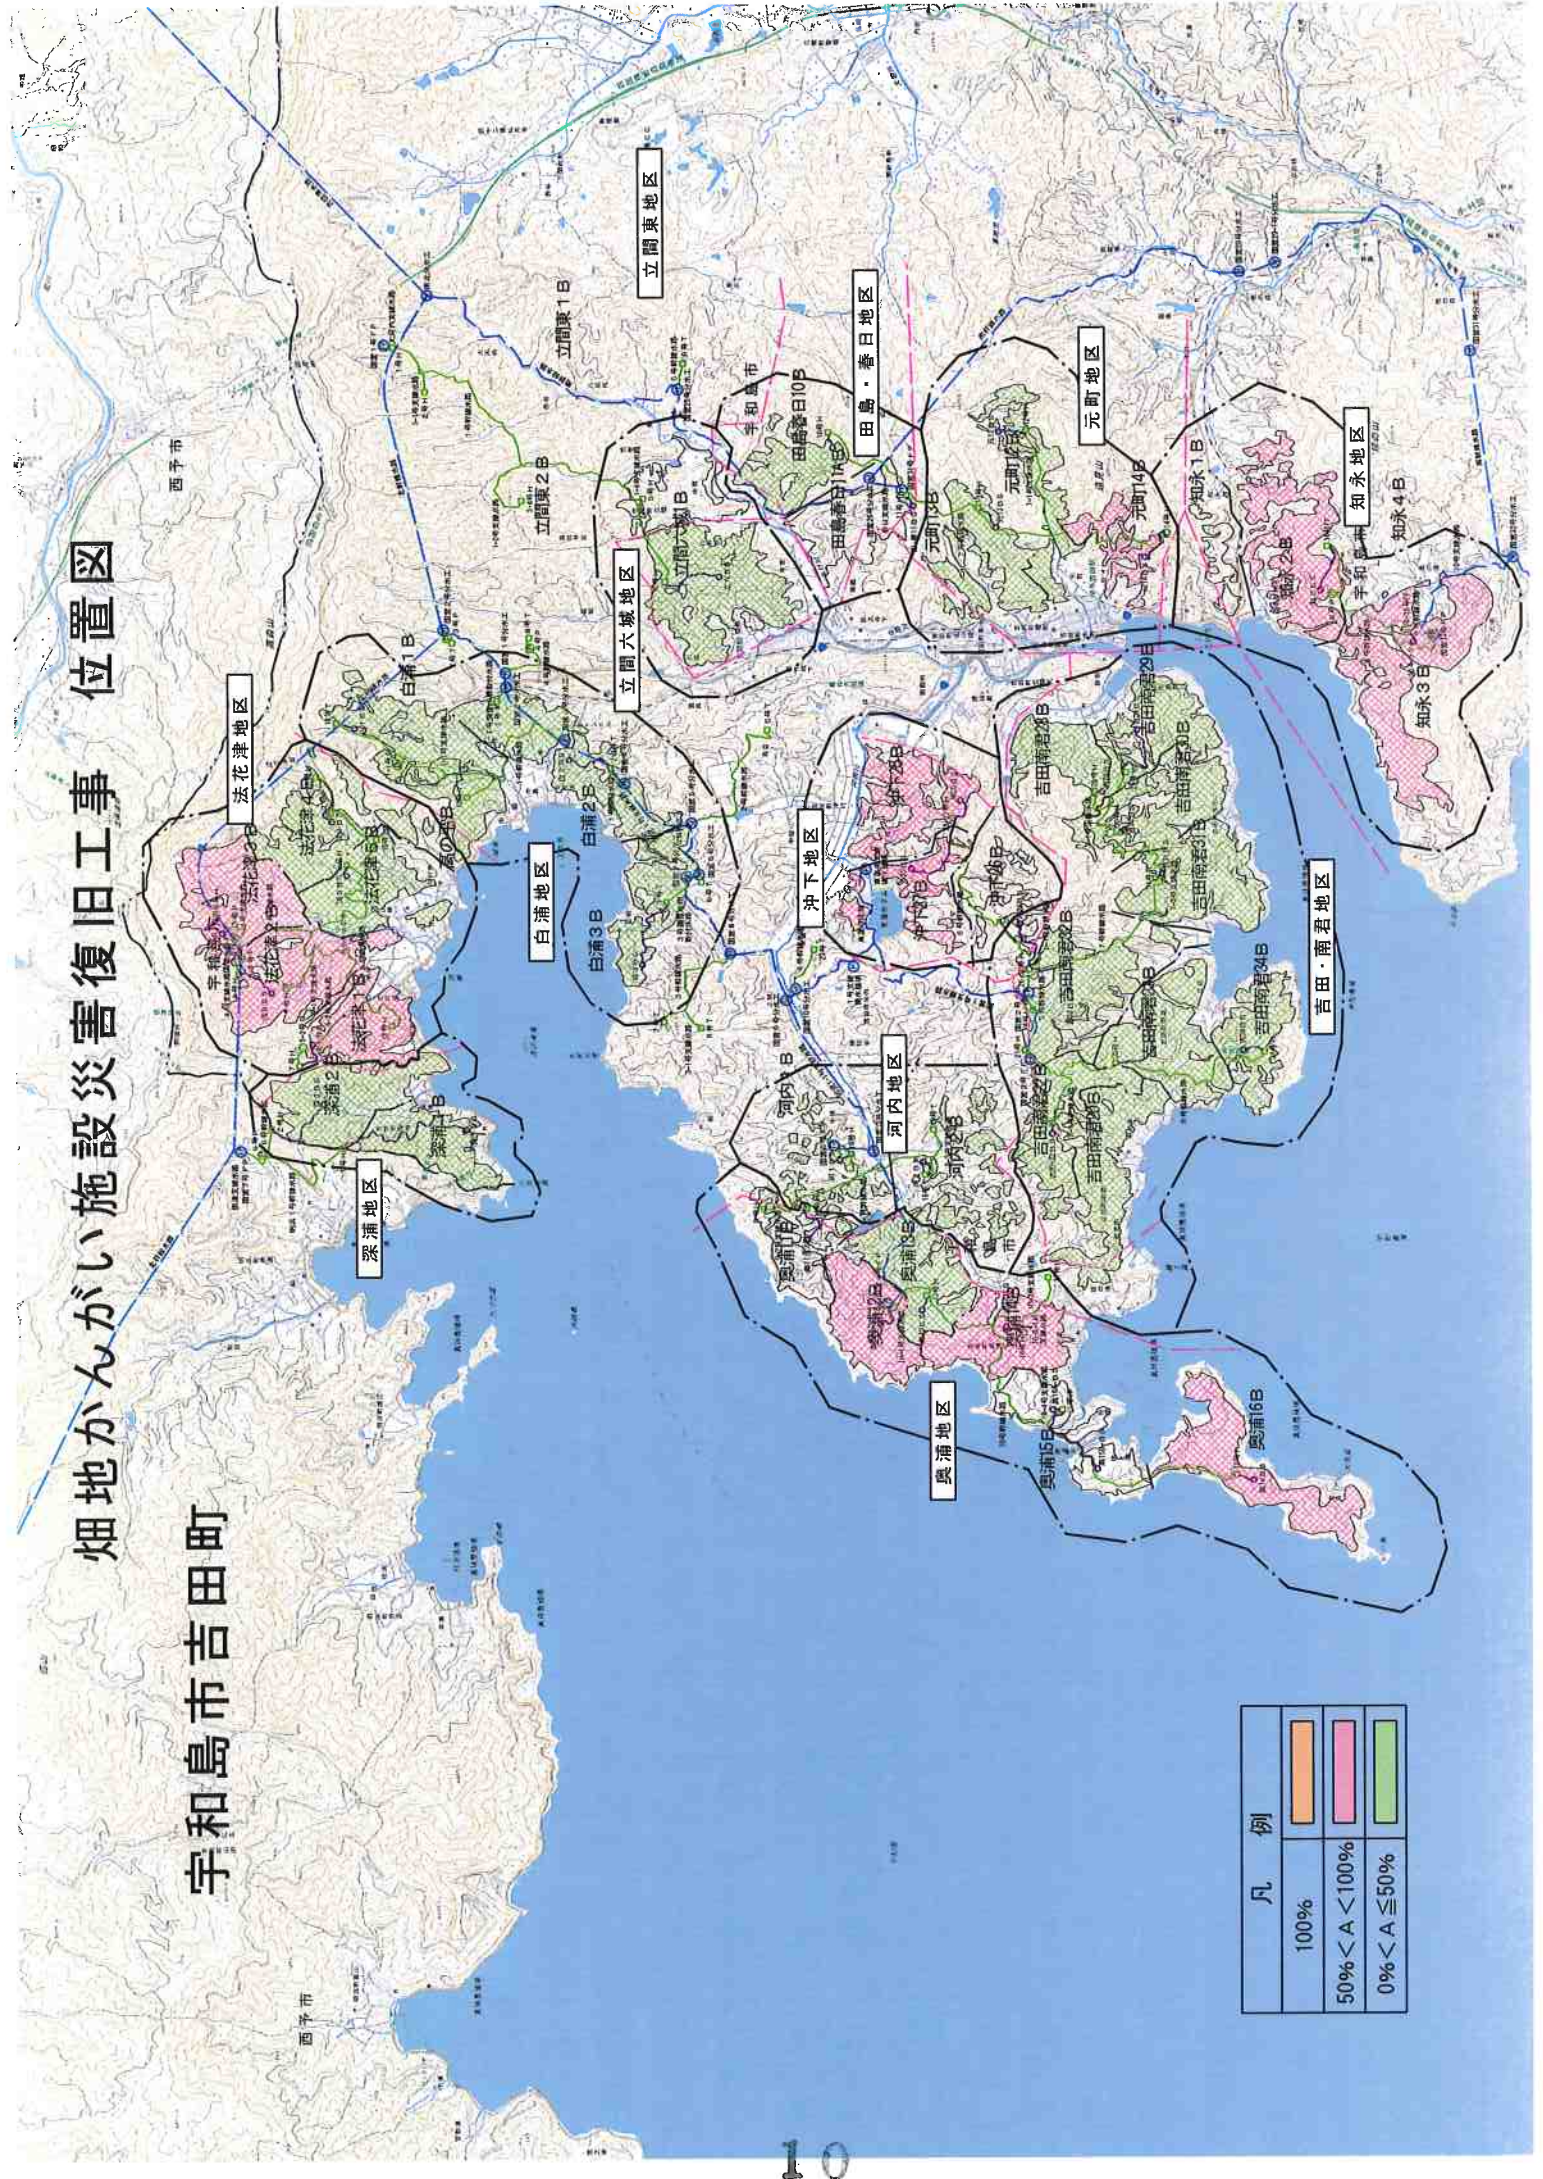

凡 例	
100%	
50% < A < 100%	
0% < A ≤ 50%	

畑地かんがい施設災害復旧工事 位置図

西予市明浜町 復旧完了

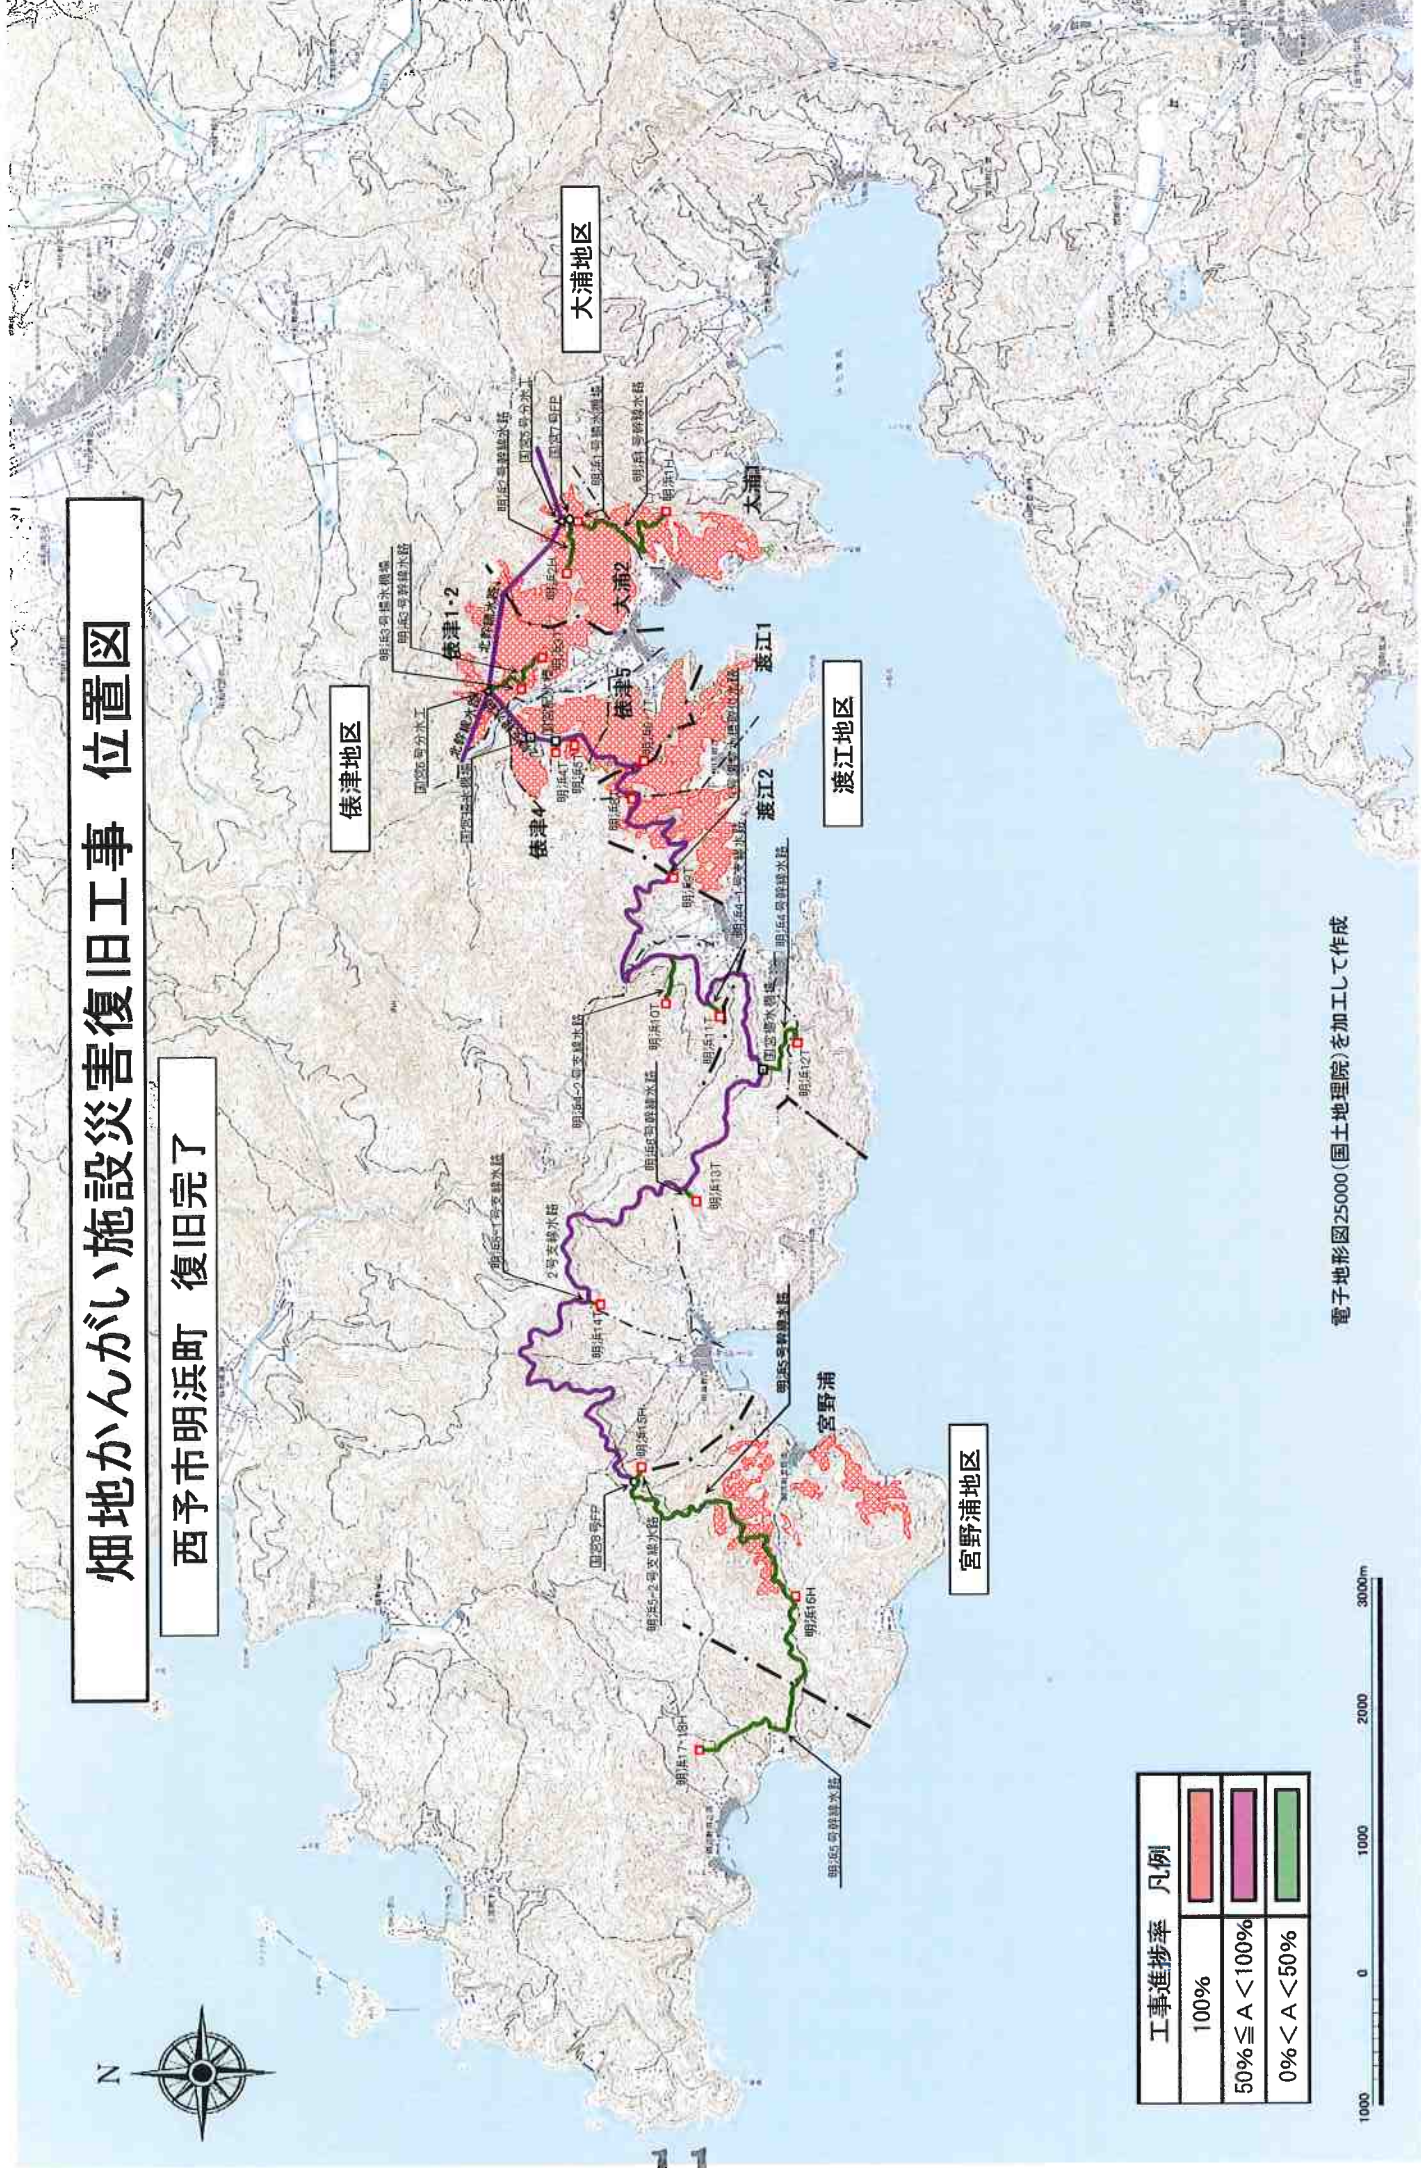

工事進捗率 凡例	
100%	
50% ≤ A < 100%	
0% < A < 50%	

電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成

