

平成30年7月豪雨関連 砂防事業 位置図

令和7年7月

白浦・法花津地区の皆様へ

愛媛県南予地方局
河川港湾課長

(お知らせ) 平成30年7月豪雨関連 砂防事業の進捗について

日頃より、県行政の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。


愛媛県では、平成30年7月豪雨で甚大な被害が発生した白浦地区と法花津地区において、土砂災害防止に向けた砂防事業を実施しているところです。

このたび、地元の皆様との情報共有を図りたく、現在の事業進捗をお知らせさせていただきますので、引き続き、事業へのご協力をお願いいたします。

なお、事業着手時の説明会等でお知らせした進捗に遅れが生じており、関係者の皆様にはご心配をおかけしているところですが、早期完成に向けて誠意努めておりますので、重ねてご協力の程、お願い申し上げます。

- 位置図 → 右図
- 進捗表 → 右面
- 計画図 → 裏面
- 問い合わせ先

愛媛県南予地方局建設部河川港湾課 災害グループ
〒798-8511 宇和島市天神町7番1号
電話 0895-22-5211 (内線435)

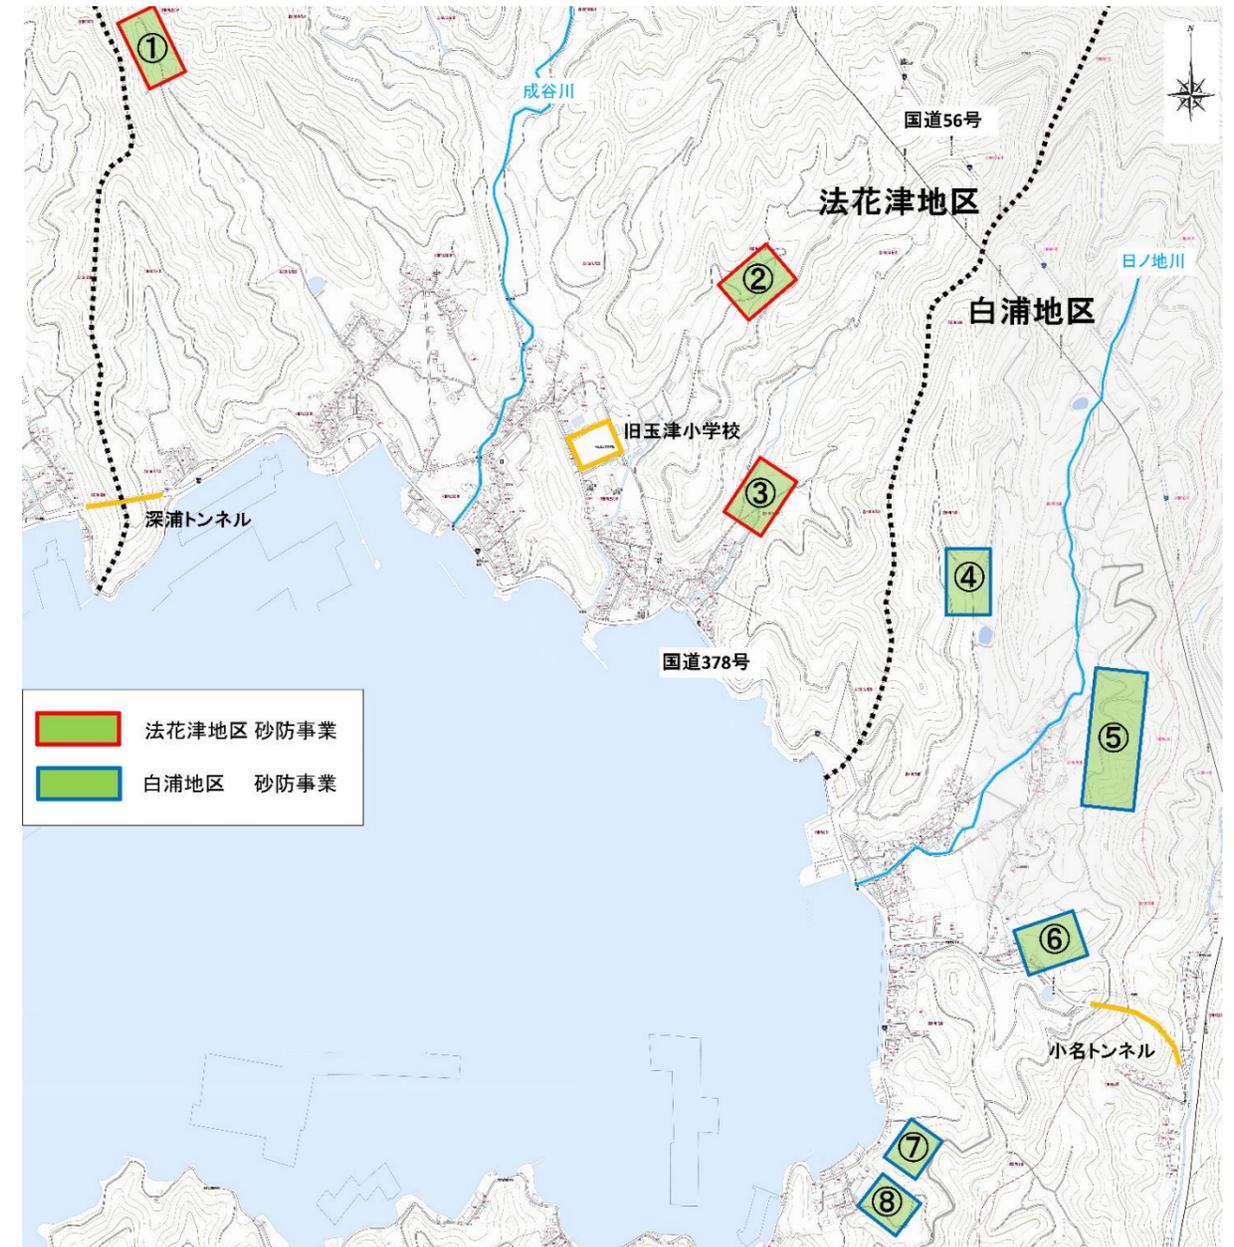

進捗表 (令和7年7月現在)

事業箇所	事業進捗			令和7年度事業内容 (予定含む)
	用地交渉等	砂防堰堤	流路工 (前庭保護・渓流保全)	
①小西川	済	未着手	(付替道路) 工事中	工事実施
②今郷川	済	—	—	対策工完了済
③大谷川	済	—	—	対策工完了済
④西ガ谷川	済	—	—	対策工完了済
⑤日ノ地川	済	工事中	工事中	工事実施
⑥泉川	済	完成	完成	対策工完了済
⑦先新浜川	済	完成	完成	対策工完了済
⑧畦屋東川	済	工事中	工事中	工事実施

※工事着手は全ての用地を取得してからになりますので、着手時期は用地交渉の状況に影響されることをご理解願います。

【事業の流れ】

測量調査設計 → 国土交通省の設計確認 → 国土調査修正 → 用地調査 → 用地交渉 → 工事着手 → 対策工完了(事業完了)

【白浦・法花津地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図

法花津地区
 白浦地区

