

計画名：地域の発展と活性化を支える愛媛の港づくり

港湾海岸課

計画の名称	1 地域の発展と活性化を支える愛媛の港づくり																		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度 (5年間)							交付対象	愛媛県										
計画の目標																			
愛媛県の港湾は、瀬戸内海と豊後水道に臨み、海陸輸送の接点及び経済流通の主要施設として古くから開け、港湾数も全国上位を占め、それぞれの地域特性に応じた機能を有している。そのため、地域特性に応じた地域の経済活動を支える小型船だまりを整備するとともに、港湾従事者・周辺住民の憩いの場を提供するための緑地の整備を行う。また、水産養殖業の発展に寄与する臨港道路の整備を行う。																			
計画の成果目標（定量的指標）																			
・小型船だまりの防波堤整備により、静穏度が確保された水域を確保することで、港湾機能の強化を図る																			
・緑地の整備により、背後圏の活性化を図る																			
・臨港道路の整備により、魚市場と水産関連業者における陸上輸送の連携強化を図る。																			
定量的指標の定義及び算定式											定量的指標の現況値及び目標値		達成率	備考					
				当初現況値 (R2当初)		中間目標値 (R4末)		最終目標値 (R6末)											
① 小型船だまりの防波堤延長のうち、整備に着手した延長の割合から算出 (目標年度における小型船だまりの静穏度確保水域の割合)				目標値： 実績値：		22%		69% 100%		100% 100%		100%							
② 緑地の整備面積当たりの利用者想定人数から算出 (目標年度における緑地の利用可能者数)				目標値： 実績値：		200人		1,700人 966人		2,700人 966人				36%	三島川之江港の緑地整備について、港湾利用者との調整の結果、事業の実施に至らなかったため。				
③ 臨港道路の改良が必要な施設数のうち、完了した施設数の割合から算出 (目標年度における臨港道路の改良が必要な施設の整備率)				目標値： 実績値：		0%		0%		100%		0%	関連工事了後の整備を予定しており、関連工事がR7年度に完了予定となったため。						
全体事業費（計画）		合計 (A+B+C)		674百万円	A	674百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)			0.0%	進捗率 (実施事業費/全体事業費)	43.9%			
実施事業費（最終）		合計 (A+B+C)		296百万円	A	296百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)		0.0%						
1. 交付対象事業																			
A1 港湾事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率 (%)	備考
											R2	R3	R4	R5	R6				
A02-001	港湾	一般	愛媛県	直接	－	重要	建設	国内物流ターミナル整備事業 道路	延長 L=58m	宇和島港・大浦地区						4	0	0.0	関連工事了後の整備を予定しており、関連工事がR7年度に完了予定となったため。
A02-002	港湾	一般	愛媛県	直接	－	重要	建設	小型船だまり整備事業 防波堤	延長 L=460m	東予港・西条地区						100	100	100.0	
A02-003	港湾	一般	愛媛県	直接	－	重要	建設	環境整備事業	緑地 5.6ha	三島川之江港・金子地区						374	0	0.0	三島川之江港の緑地整備について、港湾利用者との調整の結果、事業の実施に至らなかったため。
A02-004	港湾	一般	愛媛県	直接	－	重要	建設	環境整備事業	緑地 2.6ha	宇和島港・大浦地区						196	196	100.0	
小計（道路事業）																674	296		
A2 ○○事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率 (%)	備考
											H27	H28	H29	H30	R1				
小計（港湾事業）																0	0		
合計																674	296		
B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率 (%)	備考	
											H27	H28	H29	H30	R1				
合計																0	0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考		
1-B1-1	〇〇																	
C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	全体事業費 （百万円）	進捗率 （%）	備考
										H27	H28	H29	H30	R1				
合計															0	0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考			
1-C1-1																		
1-C1-2																		
1-C1-3																		

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。


2．事業効果の発現状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業（各要素事業）の 効果の発現状況	・小型船だまりの防波堤を整備した結果、漁船等が安全に停泊できる水域が増加した。 ・緑地を整備した結果、利用可能人数が増加した。
II 定量的指標以外の交付対象事業の効果の 発現状況 （必要に応じて記述）	

3．特記事項（今後の方針等）

引き続き事業を推進し、港湾の利便性を向上させ、地域の経済活動を支えると共に、港湾利用者や地域住民の憩いの場を提供する。

(参考図面) 社会資本整備総合交付金

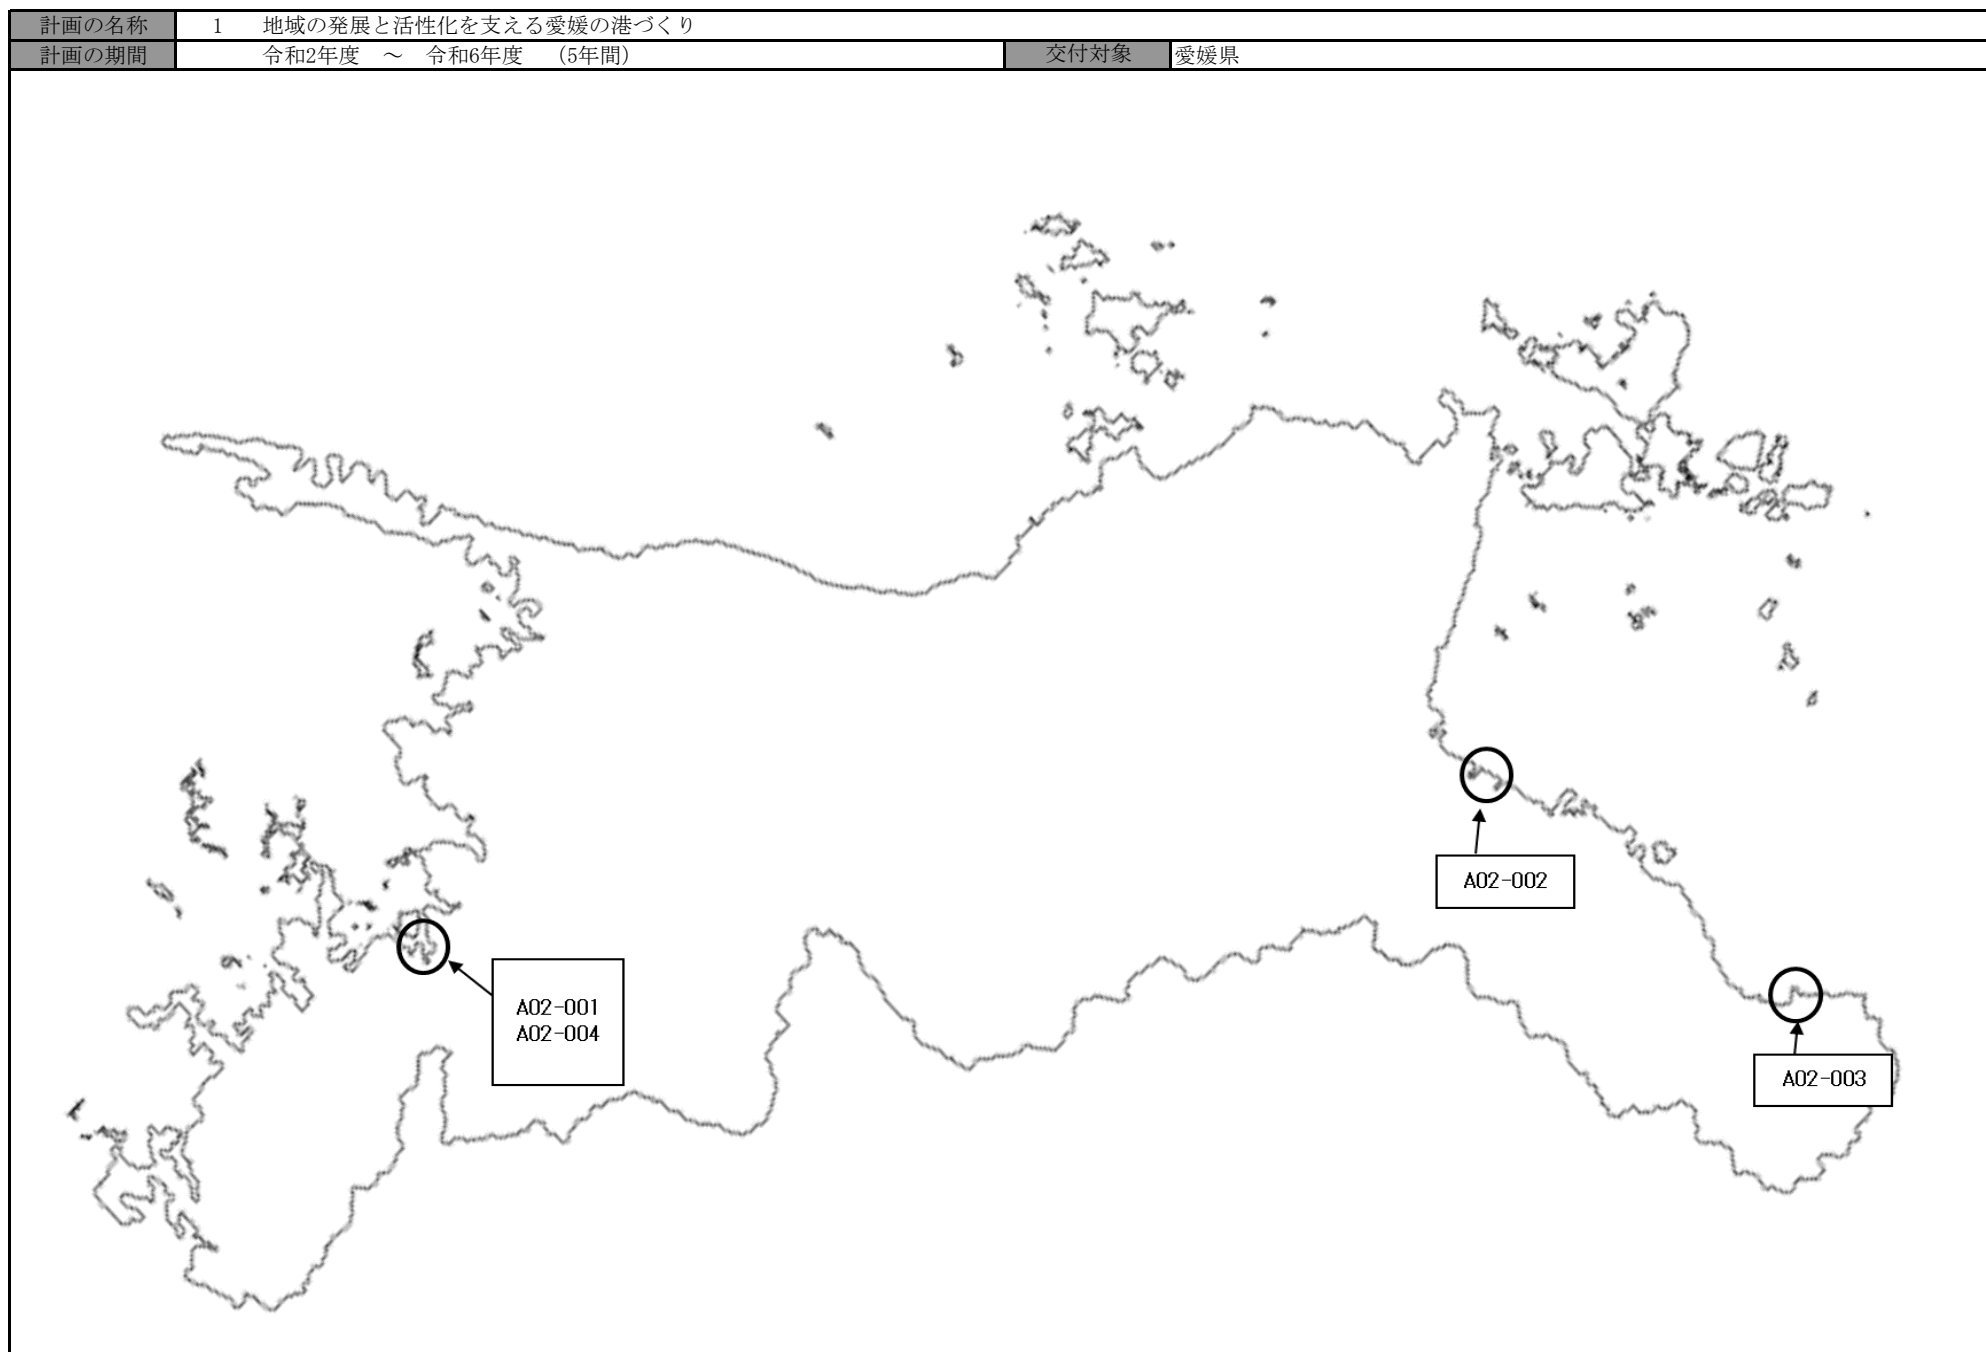

事業概要

A02-004 宇和島港 環境整備事業

本事業は、重要港湾である宇和島港において、港湾従事者のための休息緑地及び大規模地震発生時の対策施設(防災緑地)を整備するもの。

整備前



整備後

