

令和 8 年 7 月

白浦・法花津地区の皆様へ

愛媛県南予地方局
河川港湾課長

（お知らせ）平成 3 0 年 7 月豪雨関連 砂防事業の進捗について

日頃より、県行政の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

愛媛県では、平成 3 0 年 7 月豪雨で甚大な被害が発生した白浦・法花津地区において、土砂災害防止に向けた砂防事業を実施しているところです。

このたび、地元の皆様との情報共有を図りたく、現在の事業進捗をお知らせさせていただきますので、引き続き、事業へのご協力をお願いいたします。

なお、説明会等でお知らせした進捗に遅れが生じている箇所もあり、関係者の皆様にはご心配をおかけしているところですが、早期完成に向けて努めておりますので、重ねてご協力のほど、お願い申し上げます。


- 位 置 図 → 右 図
- 進 捗 表 → 右 面
- 計 画 図 → 裏 面
- 問い合わせ先

愛媛県南予地方局建設部河川港湾課

〒 7 9 8 － 8 5 1 1 宇和島市天神町 7 番 1 号

電話 0 8 9 5 － 2 2 － 5 2 1 1 （内線 4 3 5）

平成 3 0 年 7 月豪雨関連 砂防事業 位置図

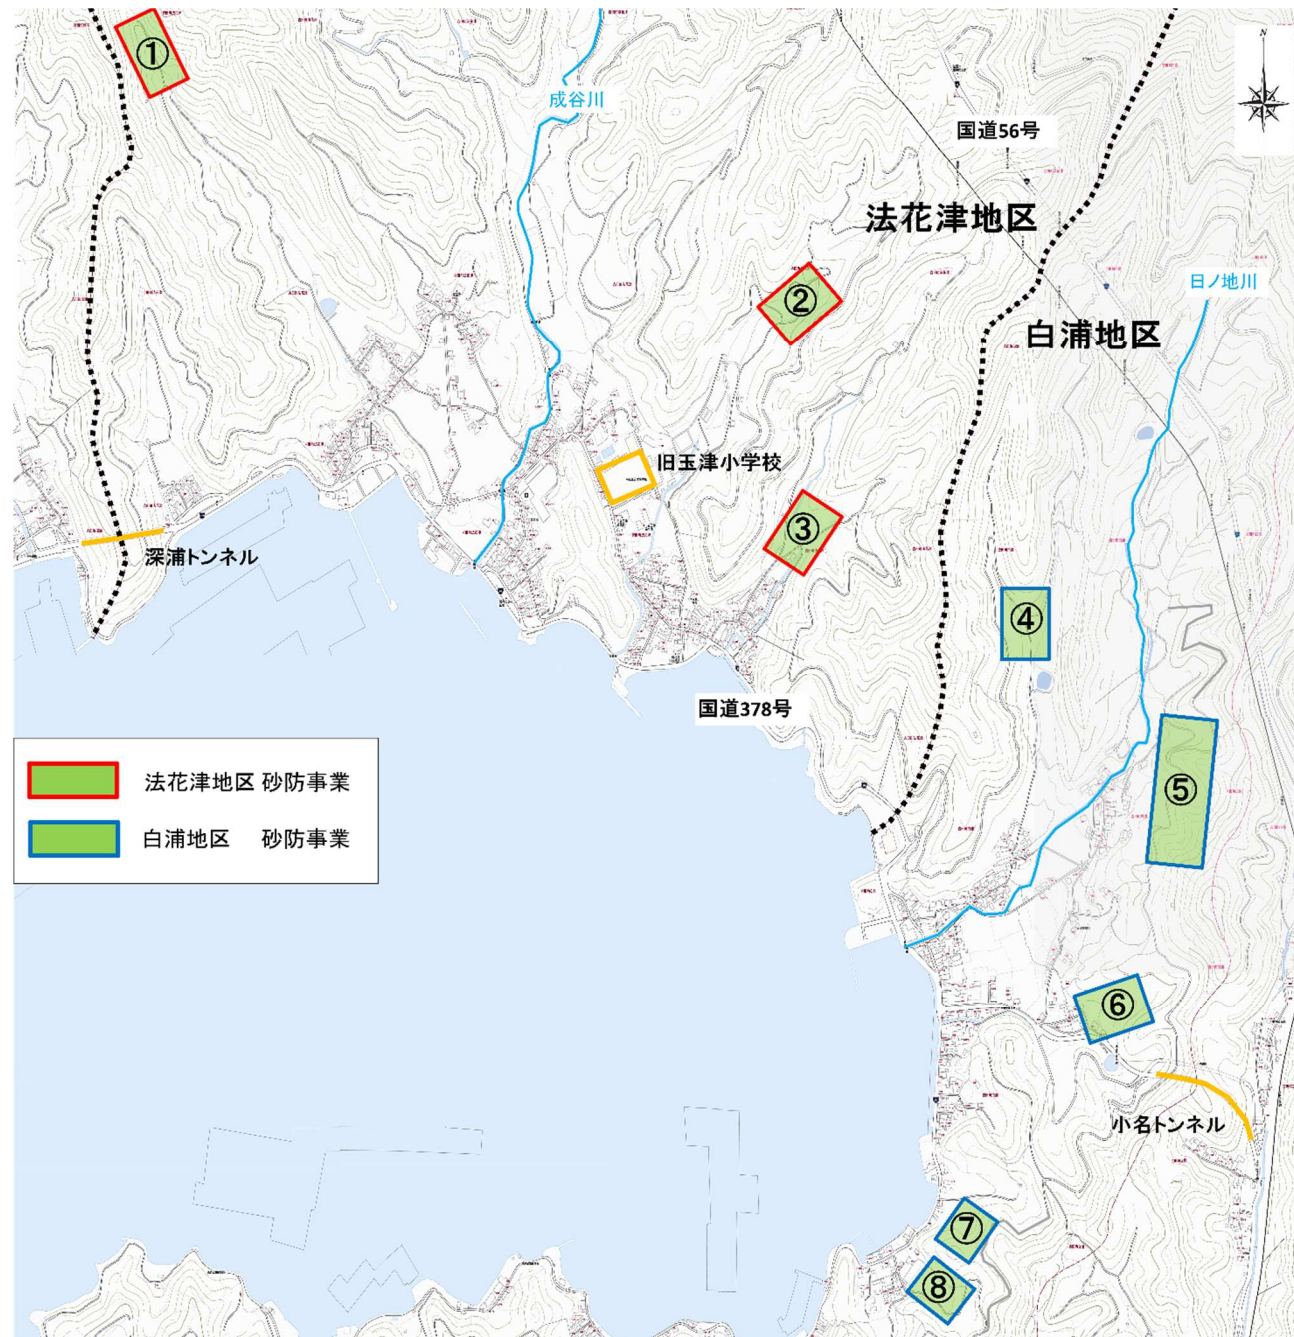

進 捗 表（令和8年4月時点）

対策工完了箇所



事業箇所	事業進捗				令和8年度事業内容 （予定含む）
	用地交渉等	砂防堰堤	流路工	付替道路等	
①小西川	済	未着手	未着手	工事中	工事実施
②今郷川	完成（法枠）				
③大谷川	完成（法枠）				
④西ガ谷川	完成（法枠）				
⑤日ノ地川	済	工事中	工事中	工事中	工事実施
⑥泉川	完成				
⑦先新浜川	完成				
⑧畦屋東川	済	工事中	工事中	工事中	工事実施

※工事着手は全ての用地を取得してからになりますので、着手時期は用地交渉の状況に影響されることをご理解願います。

【事業の流れ】

測量調査設計 → 国土交通省の設計確認 → 国土調査修正 → 用地調査 → 用地交渉 → 工事着手 → 対策工完了（事業完了）

【白浦・法花津地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図（令和8年4月時点）

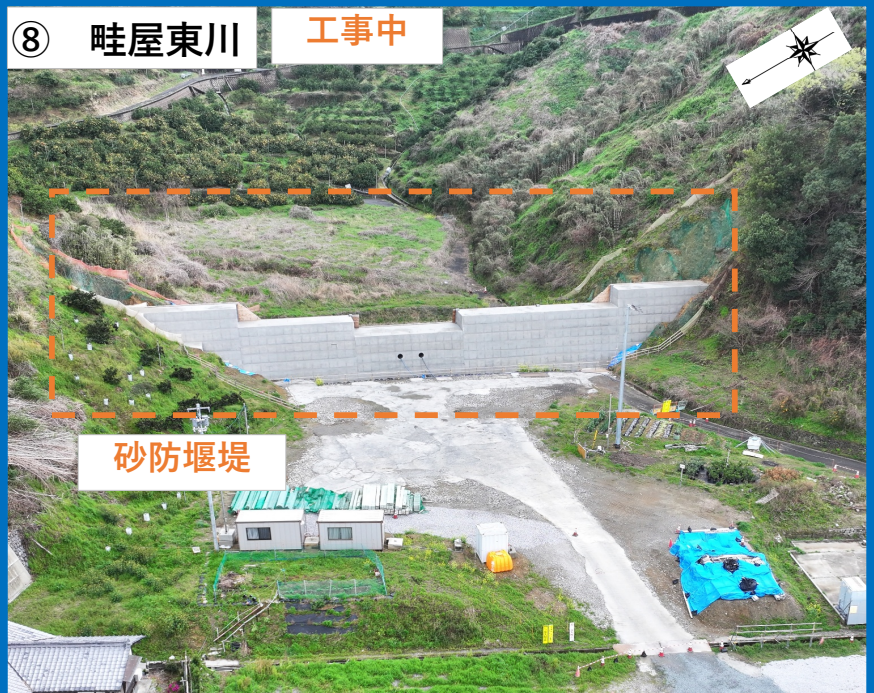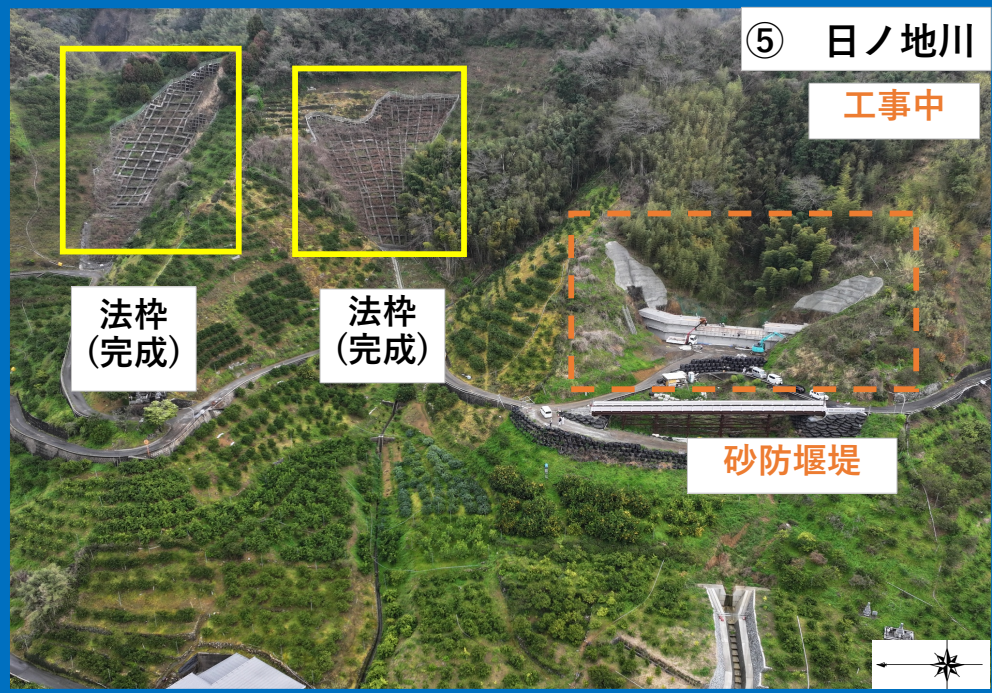

法花津地区

白浦地区
