

計画名：通学路等の生活空間における  
安全・安心の確保(防災・安全)

道路建設課、道路維持課

社会資本総合整備計画 事後評価書（中間評価書）

令和4年8月29日

計画の名称	4 通学路等の空間における安全・安心の確保（防災・安全）		
計画の期間	平成28年度～令和2年度（5年間）	交付対象	愛媛県
計画の目標	通学路交通安全プログラムにおける要対策箇所において交通安全対策を推進し、通学の児童生徒が安全に登下校することができるみちづくりを目指す。		

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>県管理道路における死傷事故抑止率 令和2年までに県管理道路における死傷事故件数を20%抑止</li> <li>県管理道路における要対策箇所の整備率 令和2年までに県管理道路における要対策箇所の整備率を100%にする。</li> </ul>
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			達成率	備考	
	当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (R1末)			
① 県管理道路における死傷事故抑止率 (R2における死傷事故件数) - (H28における死傷事故件数) / (H28における死傷事故件数)	0%	10%	20%	229%	H28: 1,295件 → R2: 703件	
② 県管理道路における要対策箇所の整備率 通学路安全対策実施済箇所数(箇所) / 通学路の要対策箇所数(箇所)	0%	50%	100%			33%
全体事業費(計画)	合計(A+B+C) 17,574百万円	A 17,539百万円	B 0百万円	C 35百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) 0.2%	進捗率 (実施事業費/全体事業費) 42.8%
実施事業費(最終)	合計(A+B+C) 7,521百万円	A 7,479百万円	B 0百万円	C 42百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) 0.6%	

1. 交付対象事業

A1 道路事業													全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率 (%)	備考			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)								
											H28	H29	H30	R1	R2				
11-A1-1	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	改築	(一)鳥音五十崎線 五十崎(11-A1-31)	バイパス L=800m	内子町						680	452	66.5	
11-A1-2	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	改築	(一)伊予宮野下停車場務田線 宮野下(11-A1-32)	現道拡幅 L=360m	宇和島市						650	161	24.8	
11-A1-3	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	改築	(一)小倉三間線 大内(11-A1-33)	バイパス L=890m	宇和島市						320	234	73.0	
11-A1-4	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	改築	(一)嵐田之浜岩松線 巽橋(11-A1-34)	現道拡幅 L=330m	宇和島市						925	592	64.0	
11-A1-5	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(一)下鍵山松野線 延野々(11-A1-100)	歩道整備 L=300m	松野町						25	24	97.6	
11-A1-6	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(主)松山東部環状線 東野~畑寺(11-A1-101)	自歩道整備 L=200m	松山市						570	223	39.1	
11-A1-7	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(主)長浜中村線 下須戒(11-A1-102)	路肩改良 L=200m	大洲市						300	409	136.2	
11-A1-8	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(主)長浜中村線 常盤町(11-A1-103)	路肩改良 L=2,000m	大洲市						60	13	20.9	
11-A1-9	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(主)松山北条線 下伊台(11-A1-104)	歩道整備 L=690m	松山市						10	10	96.9	
11-A1-10	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(主)松山東部環状線 食場町(11-A1-105)	歩道整備 L=700m	松山市						200	75	37.5	
11-A1-11	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(一)久米垣生線 越智町(11-A1-106)	路肩改良 L=100m	松山市						20	37	187.4	
11-A1-12	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(一)松山川内線 平井町~北梅本町(11-A1-107)	歩道整備 L=1,200m	松山市						61	15	24.4	
11-A1-13	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(一)砥部伊予松山線 富久町(11-A1-108)	歩道整備 L=400m	松山市						520	239	46.0	
11-A1-14	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(主)松山空港線 竹原(11-A1-109)	歩道整備 L=600m	松山市						176	24	13.8	
11-A1-15	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(主)松山港線 中央(11-A1-110)	無電柱化 L=1,200m	松山市						102	51	50.3	
11-A1-16	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(主)六軒家石手線 中央(11-A1-111)	無電柱化 L=600m	松山市						100	160	159.6	

11-A1-17	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(主)八幡浜宇和線ほか1路線 五反田ほか (11-A1-112)	交差点改良 L=1,700m	八幡浜市							513	212	41.3	
11-A1-18	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(主)新居浜別子山線 中西町 (11-A1-113)	歩道整備 L=700m	新居浜市							12	10	83.3	
11-A1-19	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(一)砥部伊予松山線 富久町② (11-A1-114)	歩道整備 L=300m	松山市							720	558	77.5	
11-A1-20	道路	一般	愛媛県	直接	-	一般国道	交安	(国)441号ほか1路線 野村町野村~阿下ほか (11-A1-115)	歩道整備 L=700m	西予市							300	36	11.8	
11-A1-21	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(一)上分三島線 下栢町 (11-A1-116)	歩道整備 L=320m	四国中央市							210	147	69.9	
11-A1-22	道路	一般	愛媛県	直接	-	一般国道	交安	(国)441号 大洲 (11-A1-117)	歩道整備 L=700m	大洲市							650	9	1.5	
11-A1-23	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(一)蕪崎土居線 土居町中村 (11-A1-118)	歩道整備 L=400m	四国中央市							450	271	60.2	
11-A1-24	道路	一般	愛媛県	直接	-	一般国道	交安	(国)197号 宇和川 (11-A1-119)	歩道整備 L=200m	大洲市							200	113	56.5	
11-A1-25	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	改築	(主)長浜中村線 沖浦 (11-A1-35)	バイパス L=186m	大洲市							270	8	3.0	
11-A1-26	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	改築	(一)伊延東多田線 東多田 (11-A1-36)	現道拡幅 L=200m	西予市							280	151	53.8	
11-A1-27	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	改築	(主)小田河辺大洲線 山鳥坂 (11-A1-37)	バイパス L=3,000m	大洲市							7,025	3,014	42.9	
11-A1-28	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	改築	(主)大平砥部線 大南 (11-A1-38)	現道拡幅 L=400m	砥部町							800	158	19.7	
11-A1-29	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	改築	(一)辰巳伊予和気停車場線 太山寺町 (11-A1-39)	現道拡幅 L=180m	松山市							180	7	3.9	
11-A1-30	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(一)上分三島線 下栢町② (11-A1-120)	歩道整備 L=240m	四国中央市							360	28	7.7	
11-A1-31	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(主)西条久万線 久万 (11-A1-121)	歩道整備 L=300m	久万高原町							250	16	6.2	
11-A1-32	道路	一般	愛媛県	直接	-	一般国道	改築	(国)441号 野村大橋	現道拡幅 L=90m	西予市							600	24	3.9	
小計 (道路事業)																17,539	7,479			

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接	間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率 (%)	備考	
											H28	H29	H30	R1	R2					
合計												0	0							


番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考				
1-B1-1	〇〇																	
C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	全体事業費 （百万円）	進捗率 （%）	備考
										H28	H29	H30	R1	R2				
11-C1-1	道路	一般	愛媛県	直接			(主) 松山港線 中央 (11-C1-100)	引込設備（無電柱化）	松山市						35	42	120.5	
													合計	35	42			
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考				
11-C1-1	本計画の要素事業(11-A1-110)と一体となって実施することにより事業効果の発現を図ることを目的として、無電柱化事業における引込設備の費用を負担する。																	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況	
I 定量的指標に関連する 交付対象事業（各要素事業）の 効果の発現状況	・歩道整備や現道拡幅等を推進することで県管理道路における交通死傷事故が減少した。
II 定量的指標以外の交付対象事業の効果の 発現状況 (必要に応じて記述)	
3. 特記事項（今後の方針等）	
引き続き、事業を推進し、児童生徒が安全に登下校できる通学路等の道路空間を創出する。	

(参考図面) 社会資本整備総合交付金

計画の名称	4 通学路等の空間における安全・安心の確保 (防災・安全)	交付対象	愛媛県
計画の期間	平成28年度 ~ 令和2年度 (5年間)		

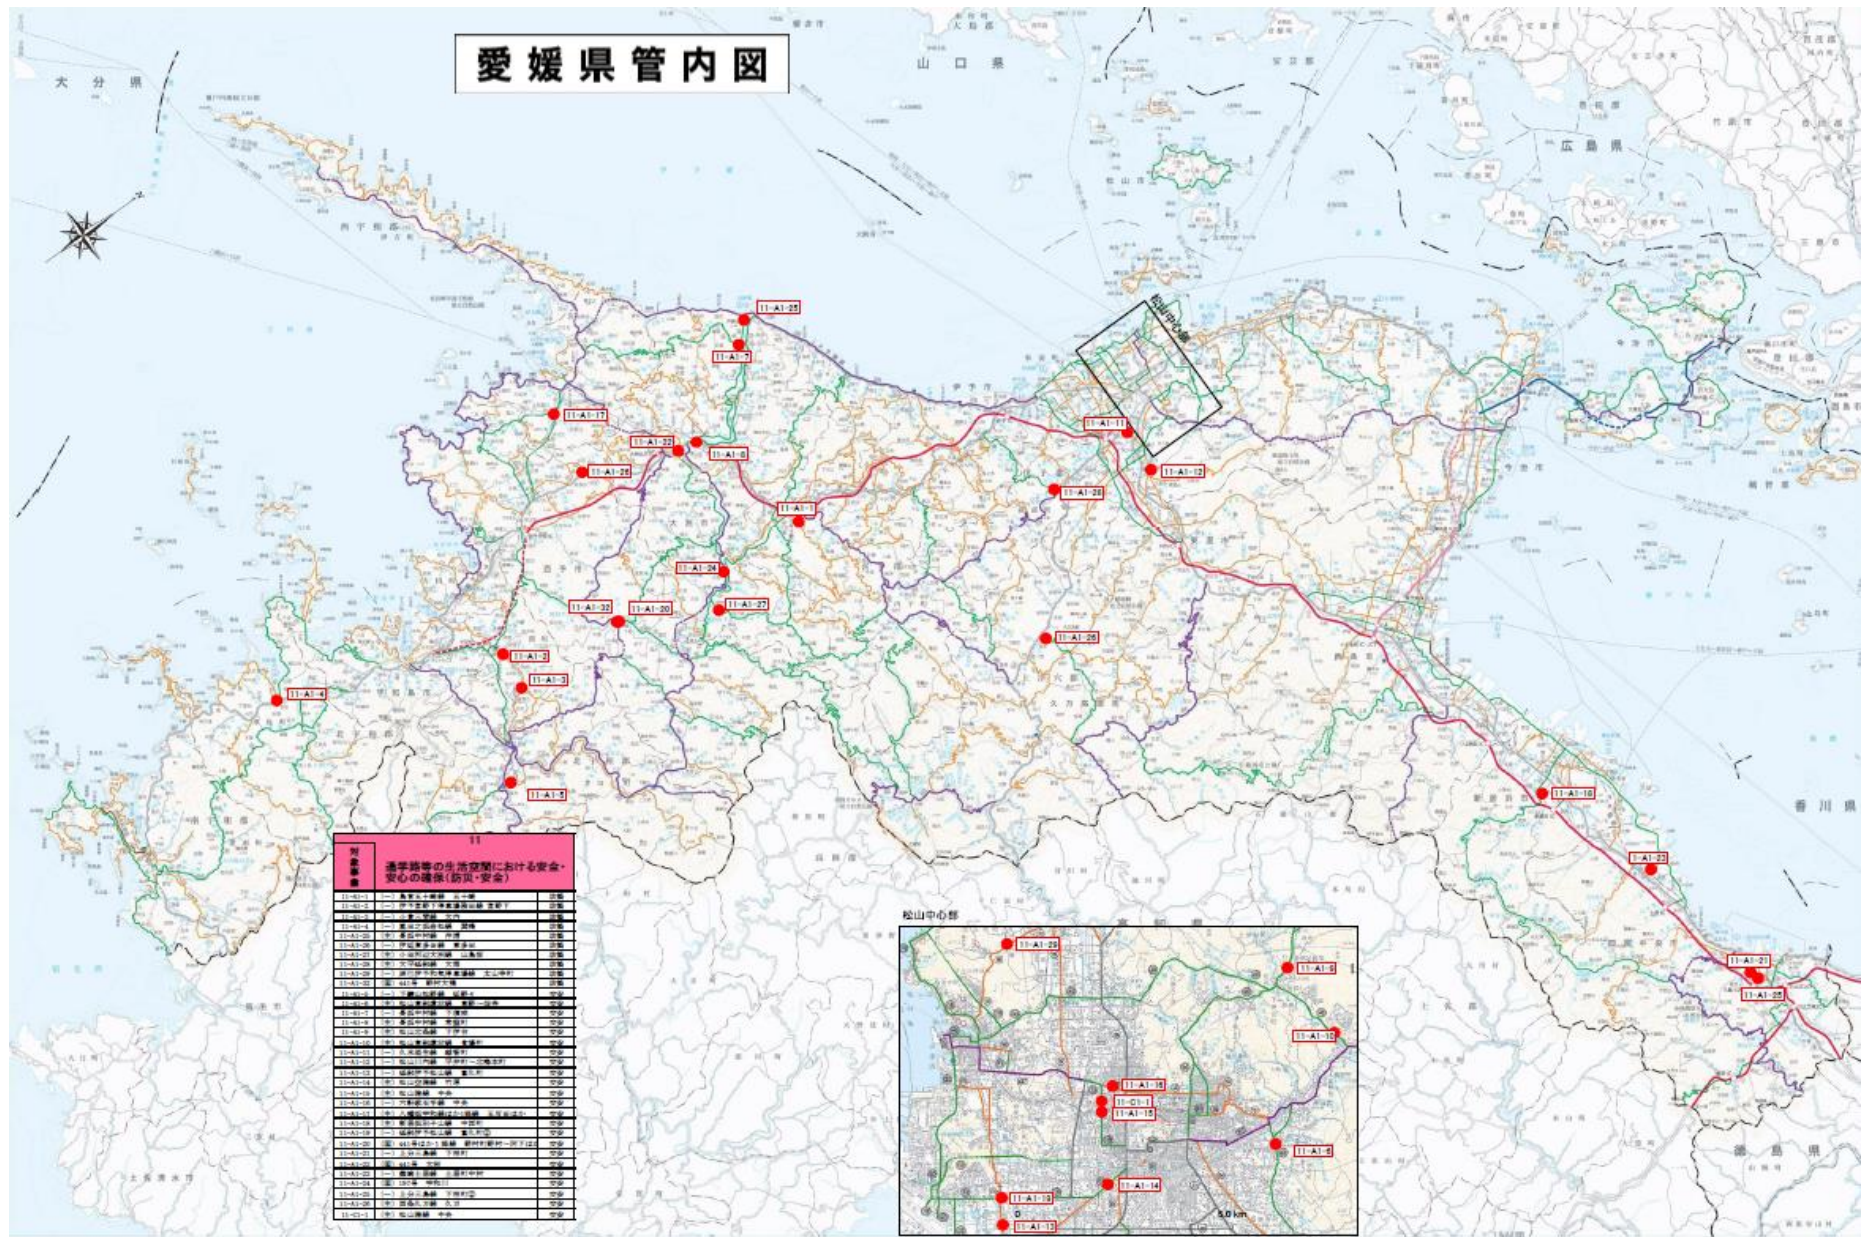

## 事業概要

### (一) 下鍵山松野線 松野町大字延野々 歩道整備事業

当路線は愛媛県北宇和郡鬼北町大字日向谷(一般国道320号交差点)を起点として、同県同郡松野町大字延野々(一般国道381号交差点)に至る延長約21.7kmの路線である。

当工区は、通学路に指定されているが、歩道がなく、小学生や中学生の通学が危険な状況にあった。

このため、当該道路を利用する歩行者の安全を確保するために、歩道整備を行った。

### (主) 松山北条線 松山市下伊台 歩道整備事業

当路線は愛媛県松山市勝山町の国道11号交差点を起点として、同市栗井河原の国道196号に接続する延長約19.9kmの路線である。

当工区は、伊台小学校及び旭中学校の通学路に指定されているが、当工区のみ歩道が未整備となっており、児童及び生徒、地域住民が日常的に危険な状態での通行を余儀なくされている状況にあった。

このため、当該道路を利用する歩行者の安全を確保するために、歩道整備を行った。

整備前



整備後



整備前



整備後

